


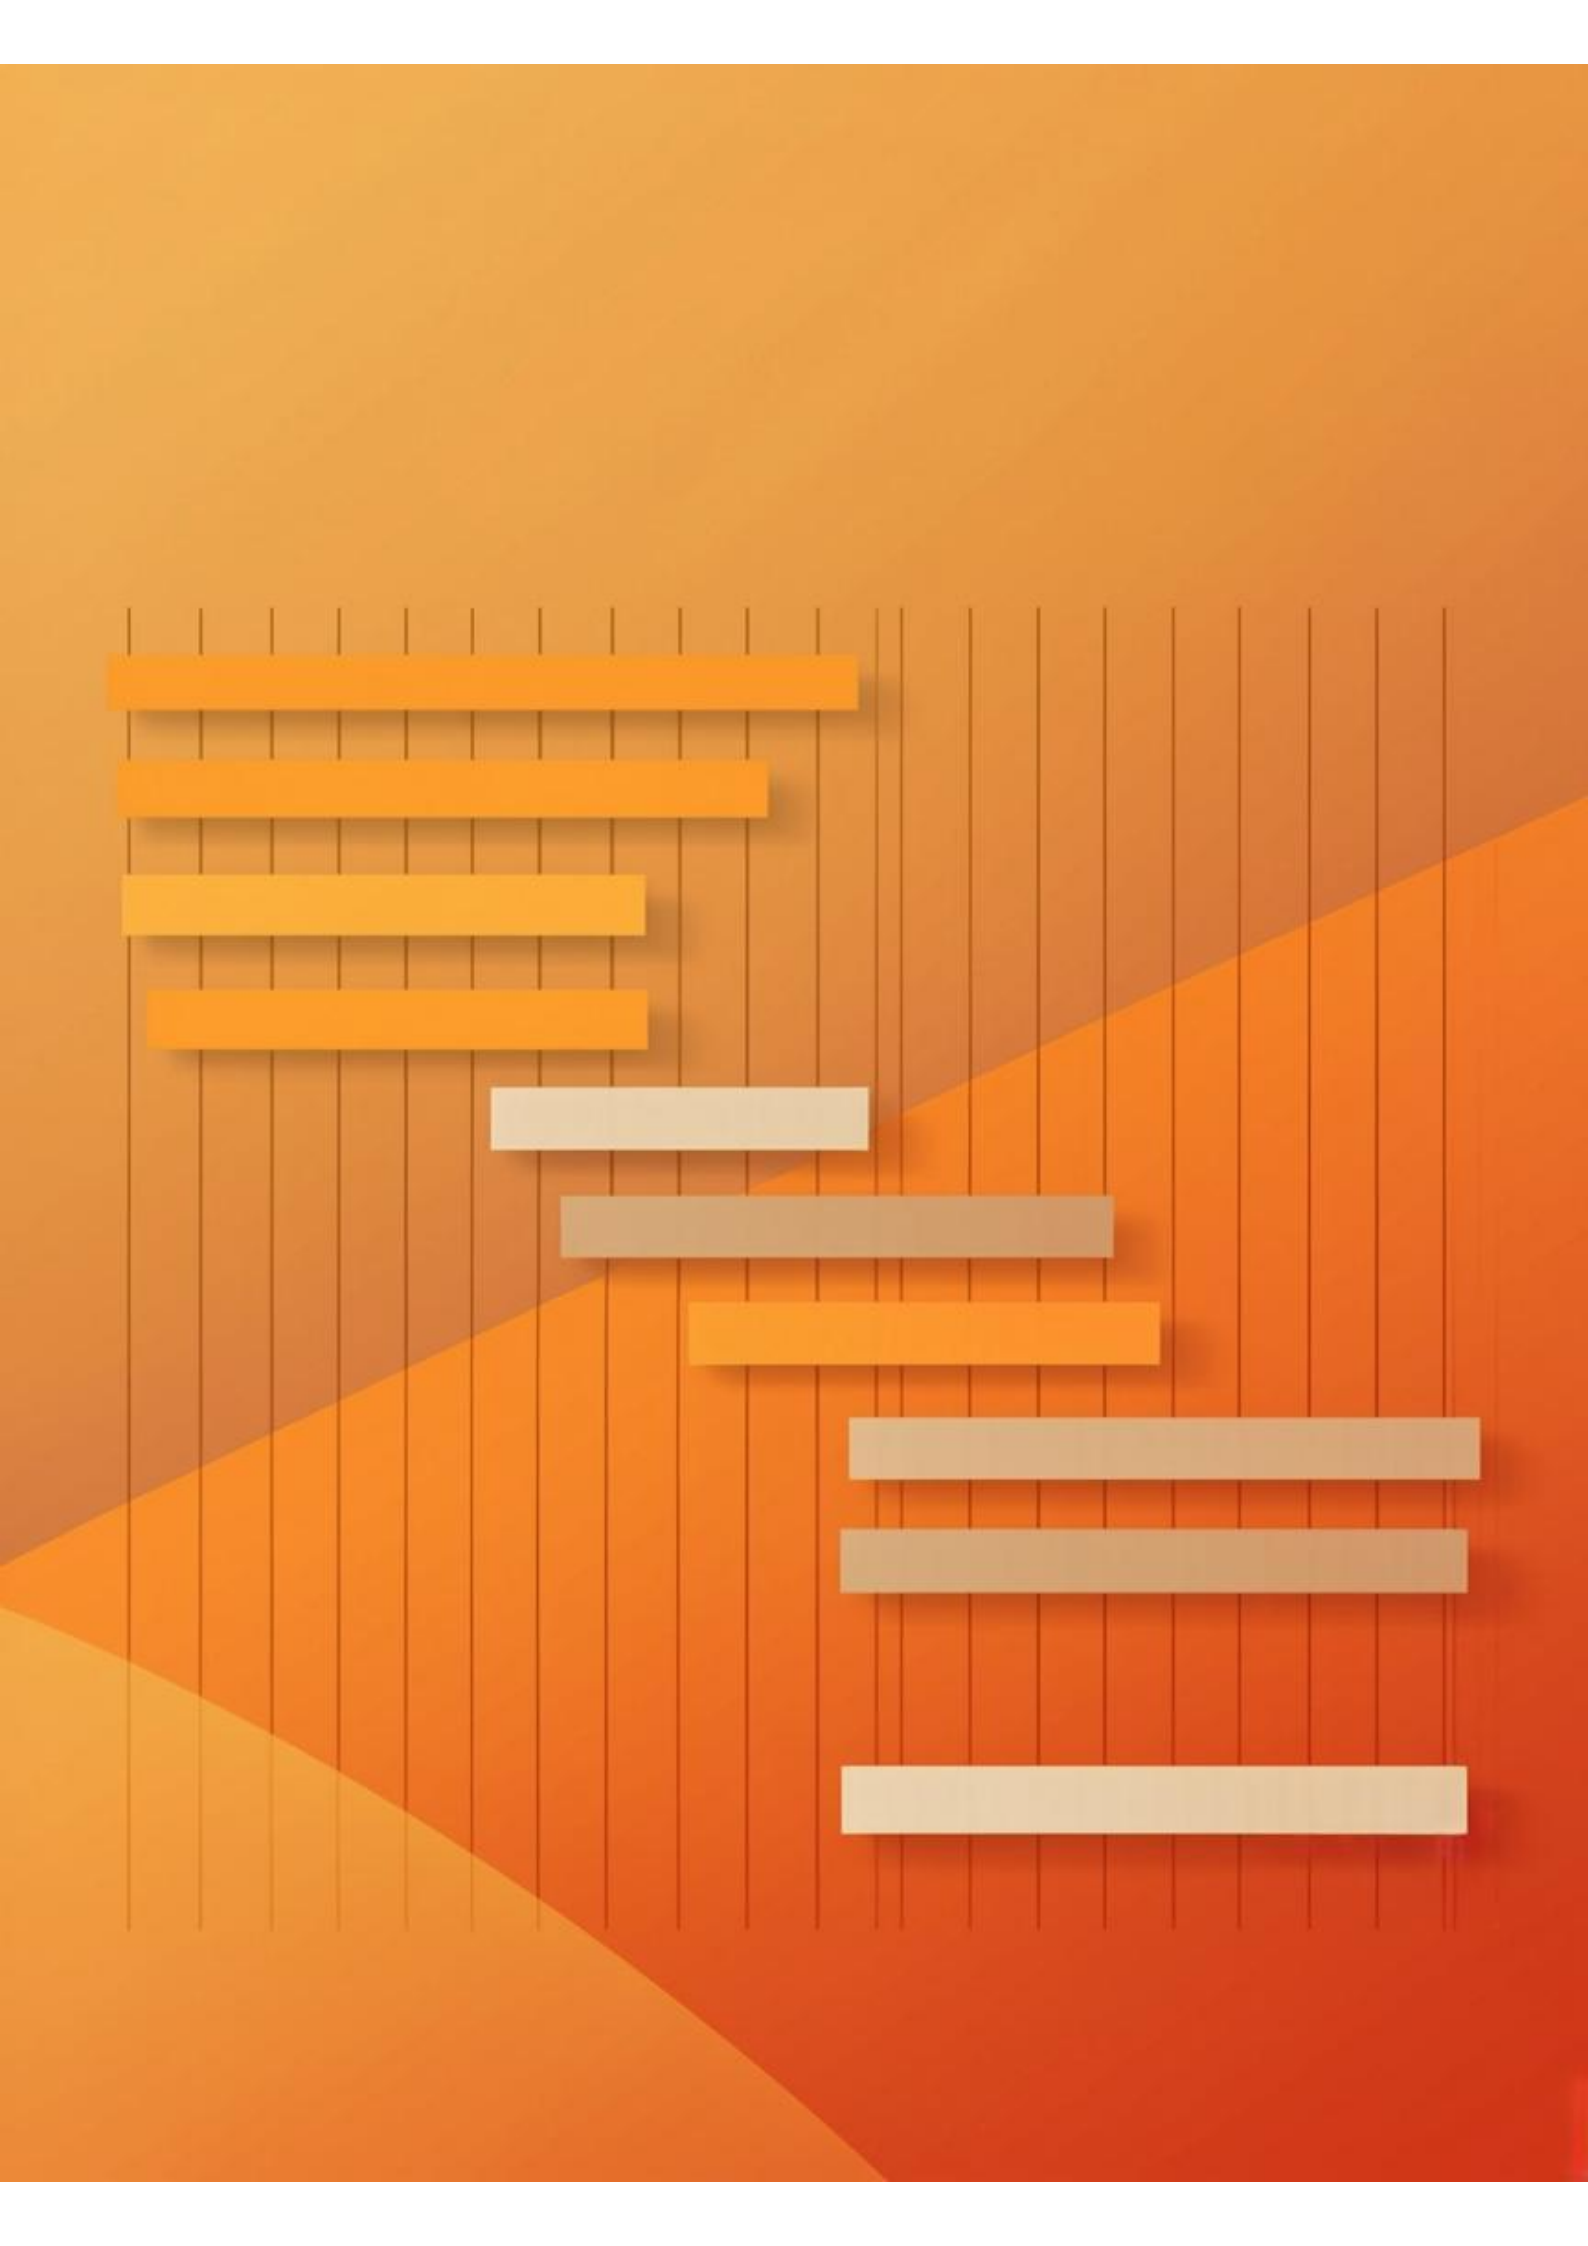

جدول المحتويات

.....	1. مقدمة في إدارة المشاريع
.....	2. دورة حياة المشروع
.....	3. إدارة المخاطر
.....	4. منهجيات أجايل وسكرم
.....	5. التخطيط وإدارة الجدول الزمني
.....	6. إدارة الفريق والقيادة

الفصل 1

مقدمة في إدارة المشاريع

إدارة المشاريع هي عملية تطبيق المعارف والمهارات والأدوات والتقنيات لتخطيط وتنفيذ وإتمام المشاريع بكفاءة وفعالية. المشروع هو جهد مؤقت له بداية ونهاية محددتان ويهدف إلى إنتاج منتج أو خدمة أو نتيجة فريدة. تختلف المشاريع عن العمليات اليومية في أنها ذات طبيعة مؤقتة وفريدة، بينما العمليات مستمرة ومتكررة. فهم هذا الفرق أساسي للتعامل مع كل منهما بالطريقة المناسبة.

دور مدير المشروع هو القلب النابض لأي مشروع ناجح. مدير المشروع هو الشخص المسؤول عن تحقيق أهداف المشروع في الوقت المحدد وضمن الميزانية المتاحة وبالجودة المطلوبة. يشمل دوره تحديد نطاق المشروع وتخطيط الموارد وإدارة الفريق والتنسيق بين أصحاب المصلحة والتعامل مع المخاطر وحل المشاكل وضمان التواصل الفعال. يجب أن يمتلك مدير المشروع مزيجاً من المهارات التقنية والإدارية والاجتماعية، وأن يكون قادراً على اتخاذ القرارات في ظروف عدم اليقين والتعامل مع الضغوط.

المثلث الحديدي أو Triple Constraint هو مفهوم أساسي في إدارة المشاريع يصف العلاقة بين ثلاثة عوامل رئيسية: النطاق والوقت والتكلفة. التغيير في أي عامل يؤثر حتماً على العاملين الآخرين. فمثلاً زيادة نطاق المشروع ستتطلب إما وقتاً إضافياً أو تكلفة أعلى أو كليهما. فهم هذا المثلث يساعد مديري المشاريع في إدارة توقعات أصحاب المصلحة واتخاذ قرارات مدروسة عند حدوث تغييرات. الجودة هي العامل الرابع الذي يربط بين هذه العوامل الثلاثة ويجب الحفاظ عليها بغض النظر عن الضغوط.

أصحاب المصلحة أو Stakeholders هم جميع الأشخاص أو المؤسسات التي يمكن أن تؤثر على المشروع أو تتأثر به. يشملون العميل الذي يمول المشروع أو يستفيد منه، وفريق العمل الذي ينفذه، والإدارة العليا التي ترعاه، والموردين الذين يوفرن الموارد، والمجتمع المتأثر به. يجب على مدير المشروع تحديد أصحاب المصلحة جميعهم وفهم توقعاتهم واحتياجاتهم وقوتهم ونفوذهم، ثم تطوير استراتيجية تواصل مناسبة لكل فئة منهم. إدارة أصحاب المصلحة بشكل فعال تقلل من المعارضة وتزيد من الدعم للمشروع.

شهادات إدارة المشاريع المهنية تعزز مصداقية المدير وتفتح له فرصاً وظيفية أفضل. شهادة PMP من معهد إدارة المشاريع الأمريكي هي الأكثر اعترافاً عالمياً وتتطلب خبرة عملية واجتياز امتحان شامل. شهادة PRINCE2 منتشرة في أوروبا وتركز على العمليات. شهادات هي للمبتدئين في المجال. اختيار الشهادة المناسبة يعتمد على CAPM تركز على منهجيات أجايل. شهادة PSM و CSM مثل Agile الخلفية والخبرة والسوق المستهدف.

أدوات إدارة المشاريع تطورت بشكل كبير في السنوات الأخيرة وتتراوح من البسيطة إلى المتقدمة. Jira هي الأداة الأشهر لإدارة المشاريع التقنية وتدعم منهجيات أجايل وسكرم. Trello يقدم واجهة بسيطة بالبطاقات والأعمدة مناسبة للمشاريع الصغيرة. Asana يوفر ميزات متقدمة لإدارة المهام والمشاريع. MS Project هو المعيار في المشاريع التقليدية الكبيرة. Monday.com و ClickUp من الأدوات الحديثة التي تجمع بين البساطة والقوة. اختيار الأداة المناسبة يعتمد على حجم الفريق وطبيعة المشروع والمنهجية المستخدمة.

المهارات الشخصية لا تقل أهمية عن المهارات التقنية في نجاح مدير المشروع. التواصل الفعال هو المهارة الأكثر أهمية حيث يقضي مدير المشروع ما بين 80 إلى 90 بالمائة من وقته في التواصل. القيادة والقدرة على تحفيز الفريق وتوجيهه نحو الأهداف المشتركة ضرورية. حل النزاعات وبناء العلاقات والتفاوض وإدارة الوقت والتخطيط الاستراتيجي كلها مهارات أساسية يجب صقلها باستمرار. المدير الناجح يوازن بين الانتباه للتفاصيل والرؤية الشاملة وبين الصرامة والمرونة.

دورة حياة المشروع

دورة حياة المشروع هي سلسلة المراحل المنهجية التي يمر بها المشروع من بدايته حتى نهايته. تساعد هذه الدورة في تنظيم العمل وضمان عدم إغفال أي جوانب مهمة وتوفير نقاط مراجعة واضحة لتقييم التقدم. تختلف تفاصيل الدورة حسب نوع المشروع والمنهجية المستخدمة، لكنها تشمل بشكل عام خمس مراحل أساسية: التهيئة والتخطيط والتنفيذ والمراقبة والإغلاق.

مرحلة التهيئة هي نقطة الانطلاق للمشروع حيث يحدد سبب وجوده وما إذا كان يستحق الاستثمار فيه. تشمل هذه المرحلة إعداد وثيقة حالة العمل أو Business Case التي تبرر الحاجة للمشروع وتوضح الفوائد المتوقعة والعائد على الاستثمار. يتم تعيين مدير المشروع في هذه المرحلة وتحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين. مخرج هذه المرحلة هو وثيقة ميثاق المشروع أو Project Charter التي تحدد الأهداف العالية المستوى والنطاق الأولي والموارد المخصصة والقيود الرئيسية.

مرحلة التخطيط هي المرحلة الأكثر أهمية وتأثيراً على نجاح المشروع. في هذه المرحلة يتم تحويل ميثاق المشروع إلى خطة تفصيلية وشاملة تشمل خطة إدارة النطاق وخطة الجدول الزمني وخطة الميزانية وخطة الجودة وخطة إدارة الموارد وخطة التواصل وخطة إدارة المخاطر. يجب أن تكون الخطة واقعية وقابلة للتنفيذ وتتضمن مؤشرات أداء واضحة لقياس التقدم. الدراسات تشير إلى أن كل دولار ينفق على التخطيط يوفر عشرة دولارات في مرحلة التنفيذ.

مرحلة التنفيذ هي حيث تنفذ خطط المشروع وتنتج المخرجات. يتم فيها توزيع المهام على أعضاء الفريق وتنسيق الموارد والبدء بإنتاج النتائج. مدير المشروع يركز في هذه المرحلة على إدارة الفريق وتسهيل العمل وحل المشاكل اليومية وضمان التواصل الفعال بين جميع الأطراف. يجب إجراء اجتماعات دورية لمتابعة التقدم ومعالجة العقبات فور ظهورها. وثائق العمل والقرارات يجب توثيقها بشكل مستمر طوال هذه المرحلة.

مرحلة المراقبة والتحكم تجري بالتوازي مع مرحلة التنفيذ وتضمن بقاء المشروع في المسار الصحيح. تشمل مقارنة الأداء الفعلي بالخطة المحددة واتخاذ إجراءات تصحيحية عند الضرورة. إدارة التغييرات هي جزء أساسي من هذه المرحلة، حيث يجب تقييم أي طلب تغيير لتأثيره على النطاق والوقت والتكلفة والجودة قبل الموافقة عليه. المراقبة المستمرة تضمن اكتشاف الانحرافات مبكراً قبل أن تتحول إلى مشاكل كبيرة.

مرحلة الإغلاق تتم بعد إتمام جميع مخرجات المشروع وتسليمها للعميل. تشمل هذه المرحلة الحصول على الموافقة النهائية من العميل على المخرجات، وتسليم الوثائق والمصادر، وتسوية العقود والمدفوعات، وإعادة تخصيص أعضاء الفريق للمشاريع الأخرى. أهم ما في هذه المرحلة هو إجراء مراجعة ما بعد المشروع أو Post-Project Review لتوثيق الدروس المستفادة والنجاحات والإخفاقات ونقاط التحسين. هذه المعرفة تعد ثروة تنظيمية تفيد المشاريع المستقبلية.

وثائق المشروع تشكل الذاكرة المؤسسية للمشروع ويجب أن تكون مكتوبة وواضحة ومنظمة. من أهم الوثائق ميثاق المشروع وخطة إدارة المشروع وهيكل تقسيم العمل وسجل المخاطر وسجل القضايا وسجل التغييرات والتقارير الدورية. الأدوات الرقمية مثل تسهيل تنظيم الوثائق ومشاركتها مع الفريق. التوثيق الجيد لا يساعد فقط في إدارة المشروع الحالي بل SharePoint و Confluence يسهل تسليم المعرفة للفرق التي ستتعامل مع المشروع لاحقاً.

إدارة المخاطر

إدارة المخاطر هي عملية منهجية لتحديد وتحليل والاستجابة للمخاطر المحتملة التي قد تؤثر سلباً على أهداف المشروع. المخاطر في إدارة المشاريع هي أحداث غير مؤكدة قد تحدث في المستقبل، وإذا حدثت ستؤثر إيجابياً أو سلباً على أهداف المشروع. فهم إدارة المخاطر ليس معناه تجنب المخاطر بالكامل لأن بعض المخاطر ضرورية لتحقيق الفرص، بل هو التعامل معها بشكل مدروس ومخطط.

الخطوة الأولى في إدارة المخاطر هي تحديد المخاطر أو Risk Identification. يجب إشراك جميع أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة في هذه العملية لأن كل طرف قد يرى مخاطر لا يراها الآخرون. التقنيات المستخدمة تشمل عصف الأذهان وتحليل SWOT وتحليل السيناريوهات ومراجعة الدروس المستفادة من مشاريع سابقة ومراجعة قوائم التحقق. يجب وصف كل خطر بوضوح شامل يحدد الشرط الذي قد يسبب المشكلة والنتيجة المحتملة. السجل الشامل للمخاطر هو الأداة الرئيسية لتوثيق وتتبع جميع المخاطر المحددة.

تحليل المخاطر يتكون من جزأين: التحليل النوعي والتحليل الكمي. التحليل النوعي يقيم كل خطر حسب احتمالية حدوثه وتأثيره المحتمل. يستخدم غالباً مصفوفة الاحتمالية والأثر التي تصنف المخاطر إلى فئات مثل منخفضة ومتوسطة وعالية ودرجة. هذا التصنيف يساعد في تحديد أولويات المعالجة. التحليل الكمي يستخدم تقنيات رياضية وإحصائية لتحديد القيمة المالية المتوقعة للمخاطر وتأثيرها المحتمل على الجدول الزمني والميزانية. المحاكاة بمونت كارلو من التقنيات المتقدمة في التحليل الكمي.

استراتيجيات الاستجابة للمخاطر السلبية تشمل أربع استراتيجيات رئيسية. تجنب المخاطر involves تغيير خطط المشروع للقاء على التخطأ تماماً، مثل تغيير المورد أو تغيير النهج التقني. تخفيف المخاطر involves اتخاذ إجراءات لتقليل احتمالية الحدوث أو الأثر، مثل إضافة مهلة زمنية احتياطية أو تدريب الفريق. نقل المخاطر involves نقل مسؤولية التعامل مع الخطر لطرف آخر، مثل شراء تأمين أو التعاقد مع متخصص. قبول المخاطر involves الاعتراف بالخطر وعدم اتخاذ إجراء استباقي مع إعداد خطة طوارئ إذا حدث.

استراتيجيات التعامل مع فرص المخاطر الإيجابية تشمل استغلال الفرصة بتأكيد حدوثها وتعزيز الاحتمالية أو الأثر، ومشاركة الفرصة بتخصيص ملكيتها لطرف أكثر قدرة على تحقيقها، وتعزيز الفرصة بزيادة احتمالية حدوثها أو تأثيرها، وaccepting الفرص بالاعتراف بها دون عمل استباقي. كثير من مديري المشاريع يركزون فقط على المخاطر السلبية ويتجاهلون الفرص الإيجابية مما يفوت فرص تحسين نتائج المشروع.

مراقبة المخاطر هي عملية مستمرة طوال حياة المشروع. يجب مراجعة سجل المخاطر بانتظام في اجتماعات الفريق وتحديث تقييمات الاحتمالية والأثر بناءً على المستجدات. يمكن أن تظهر مخاطر جديدة في أي مرحلة من مراحل المشروع كما يمكن أن تختفي مخاطر محددة سابقاً. التواصل الفعال حول المخاطر مع الفريق وأصحاب المصلحة يضمن وعي الجميع ويسمح بالاستجابة السريعة. مراجعة فعالية استراتيجيات الاستجابة وتعديلها عند الحاجة يضمن أن إدارة المخاطر تبقى فعالة ومتجاوبة مع الواقع.

ثقافة إدارة المخاطر يجب أن تزرع في فريق المشروع بأكمله وليس فقط في مدير المشروع. يجب تشجيع أعضاء الفريق على الإبلاغ عن المخاطر المحتملة دون خوف من العقاب. بيئة العمل التي تعاقب على الإبلاغ عن المشاكل هي بيئة خطيرة تخفي المخاطر حتى تصبح أزمات. المكافأة على اكتشاف المخاطر مبكراً تعزز ثقافة الاستباقية. بعض أفضل الممارسات في إدارة المخاطر تشمل تخصيص احتياطي للمخاطر في الميزانية والجدول الزمني، وتعيين مالك لكل خطر يكون مسؤولاً عن متابعته، ومراجعة المخاطر في كل اجتماع لفريق المشروع.

منهجيات أجايل وسكرم

منهجية أجايل أو Agile هي نهج تطوير تكراري وتكاملي يركز على تقديم القيمة للعميل بشكل سريع ومستمر مع القدرة على التكيف مع التغييرات. نشأت أجايل كرد فعل على منهجيات التطوير التقليدية الشديدة الصرامة مثل الشلال التي تتطلب تحديد كل المتطلبات مسبقا وتنفيذها خطوة بخطوة. نشر بيان أجايل في عام 2001 وأكد على أربع قيم أساسية: الأفراد وتفاعلاتهم فوق العمليات والأدوات، والبرمجيات العاملة فوق التوثيق الشامل، والتعاون مع العميل فوق التفاوض العقدي، والاستجابة للتغيير فوق اتباع خطة ثابتة.

سكرم أو Scrum هي إطار عمل عملي ضمن عائلة أجايل وهو الأكثر استخداما في تطوير البرمجيات. يعرف سكرم أدوارا محددة وفعاليات ونتائج. الأدوار الثلاثة هي مالك المنتج الذي يمثل العميل ويحدد الأولويات، وسكرم ماستر الذي يسهل العمل ويزيل العقبات، وفريق التطوير الذي ينفذ العمل. كل دور له مسؤوليات واضحة ولا يوجد تداخل في الصلاحيات. مالك المنتج يقرر ماذا يصنع، وسكرم ماستر يهتم بكيفية العمل، وفريق التطوير يحدد كم يصنع في كل تكرار.

السباقات أو Sprints هي قلب منهجية سكرم. السباق هو فترة زمنية ثابتة مدتها عادة بين أسبوعين وأربعة أسابيع ينفذ فيها فريق التطوير مجموعة من المهام المحددة وينتج شوطا عمل قابل للاستخدام. بداية كل سباق تبدأ بتخطيط السباق حيث يختار الفريق المهام من قائمة المنتج الخلفية ويحدد هدف السباق. نهاية السباق تتضمن مراجعة السباق حيث يعرض الفريق ما أنجزه للعميل وأصحاب المصلحة، ثم اجتماع استرجاع السباق حيث يراجع الفريق أداءه ويحدد تحسينات للسباق القادم.

قائمة المنتج الخلفية أو Product Backlog هي القائمة الشاملة لجميع المتطلبات والمهام المطلوبة في المشروع مرتبة حسب الأولوية. يديرها مالك المنتج ويضمن أنها محددة بوضوح ومرتبطة بناء على القيمة التي تقدمها. قائمة السباق الخلفية أو Sprint Backlog هي مجموعة المهام المحددة للسباق الحالي مع خطة تنفيذها. يختار فريق التطوير المهام من قائمة المنتج الخلفية بناء على قدرته وقدره التقديرية وهدف السباق. لا يسمح بإضافة مهام جديدة للسباق بعد بدئه.

قصص المستخدم أو User Stories هي طريقة لكتابة المتطلبات من منظور المستخدم. تتبع قصة المستخدم النمط: بصفتي مستخدم معين أريد أن أفعل شيئا معينا حتى أحصل على فائدة محددة. هذا النمط يضمن التركيز على القيمة للمستخدم وليس على التفاصيل التقنية. يجب أن تكون كل قصة مستخدم صغيرة بما يكفي للانتهاء في سباق واحد وقابلة للاختبار ومحددة بمعايير قبول واضحة. تقدير قصص المستخدم يتم عادة باستخدام نقاط القصة أو Story Points التي تعكس الجهد والتعقيد وليس فقط الوقت.

الاجتماع اليومي أو Daily Standup هو اجتماع قصير يعقد كل يوم في نفس الوقت ويشارك فيه فريق التطوير كاملا وسكرم ماستر. يجيب كل عضو على ثلاثة أسئلة: ماذا أنجزت بالأمس، وماذا سأنجز اليوم، وهل هناك أي عقبات. يجب أن يكون الاجتماع موجزا ولا يتجاوز 15 دقيقة. الفوائد تشمل محاذاة الفريق يوميا واكتشاف العقبات مبكرا وتعزيز التواصل والتعاون. لافئة السباق أو Sprint تعرض حالة المهام بشكل مرئي عادة في أعمدة: للتنفيذ وقيد التنفيذ والمراجعة والمكتملة Board.

مقارنة بين أجايل والمنهجية التقليدية تظهر اختلافات جوهرية. المنهجية التقليدية تتبع تدفقا خطيا وتتطلب إكمال كل مرحلة قبل الانتقال للتي تليها، بينما أجايل تعمل بتكرارات قصيرة تنتج قيمة ملموسة في كل تكرار. المنهجية التقليدية تناسب المشاريع ذات المتطلبات الثابتة والواضحة، بينما أجايل تتناسب مع المشاريع ذات المتطلبات المتغيرة والبيئات غير المستقرة. في الواقع العملي كثير من المشاريع تستخدم نهجا هجينا يجمع بين عناصر من كلا المنهجيتين حسب طبيعة المشروع وسياقه.

التخطيط وإدارة الجدول الزمني

إدارة الجدول الزمني هي عملية تحديد جدول زمني واقعي للمشروع يتضمن بدء ونهاية كل نشاط ومراحل رئيسية واعتماديات بين المهام. الجدول الزمني الجيد يساعد في تتبع التقدم وتحديد التأخيرات مبكرا واتخاذ الإجراءات التصحيحية. من أهم التحديات في إدارة الجدول الزمني تقدير مدة الأنشطة بدقة والتعامل مع الاعتماديات بين المهام وإدارة التغييرات والتوقعات غير الواقعية من أصحاب المصلحة.

هيكل تقسيم العمل أو WBS هو أداة أساسية في تخطيط المشروع تقسم العمل الكلي للمشروع إلى مكونات أصغر يسهل إدارتها وتقديرها وتنفيذها. يتم التقسيم بشكل هرمي بدءا من المشروع ثم المراحل ثم التوصيلات ثم المهام. كل مستوى يفصل المستوى الأعلى إلى مكونات أكثر تحديدا. القاعدة العامة تقول إن المهام في أدنى مستوى يجب أن يمكن إنجازها بين 8 و 80 ساعة من العمل. WBS يساعد في ضمان عدم إغفال أي جزء من العمل ويوفر أساسا صلبا لتقدير الوقت والموارد وتوزيع المسؤوليات.

مخطط جانث أو Gantt Chart هو أداة تصويرية تعرض الأنشطة على طول المحور الأفقي والوقت على المحور العمودي. يظهر كل نشاط بشريط يوضح مدته ووقت بدئه وانتهائه مع أسهم توضح الاعتماديات بين الأنشطة. مخطط جانث يتيح رؤية شاملة للمشروع بأكمله ويساعد في تحديد المسار الحرج والموارد المطلوبة في كل فترة. أدوات مثل Microsoft Project و GanttPRO و TeamGantt توفر ميزات متقدمة لإدارة مخططات جانث رقمية يسهل تحديثها ومشاركتها مع الفريق وأصحاب المصلحة.

طريقة المسار الحرج أو Critical Path Method هي تقنية لتحديد أطول مسار من المهام المترابطة في المشروع. المهام على المسار الحرج ليس لها أي وقت احتياطي أو Float، مما يعني أن أي تأخير في مهمة حرجية سيؤدي لتأخير المشروع بأكمله. تحديد المسار الحرج يساعد مدير المشروع في التركيز على المهام الأكثر تأثيرا على الجدول الزمني. تقنية التسريع أو Crashing involve إضافة موارد لتقليل مدة المهمة الحرجة، بينما التقنية السريعة أو Fast Tracking involve تنفيذ مهام متتالية بشكل متوازي.

تقدير مدة الأنشطة يمكن أن يتم بثلاث طرق رئيسية. التقدير القياسي حيث يتم تقدير المدة بناء على الخبرة والمعارف السابقة بمهام مشابهة. التقدير التناظري حيث يقارن النشاط الحالي بنشاط سابق مشابه ويعدل التقدير بناء على الفروقات. تقدير النقاط الثلاث أو حيث يحدد لكل نشاط ثلاثة تقديرات: المتفائل والمتشائم والأكثر احتمالية، ثم يحسب المتوسط المرجح. هذا الأسلوب يعطي PERT تقديرا أكثر واقعية لأنه يأخذ في الاعتبار عدم اليقين المتأصل في تقدير المشاريع.

المراحل الرئيسية أو Milestones هي نقاط مرجعية مهمة في الجدول الزمني تشير إلى إتمام إنجاز رئيسي في المشروع. أمثلة على المراحل الرئيسية إكمال مرحلة التصميم وبدء مرحلة التنفيذ وإتمام الاختبار والتسليم النهائي. المراحل الرئيسية تساعد في تتبع التقدم والتواصل مع أصحاب المصلحة والاحتفال بالإنجازات. يجب أن تكون كل مرحلة رئيسية محددة وقابلة للتحقق وذات دلالة واضحة. عادة ما تكون المراحل الرئيسية نهاية مرحلة أو تسليم مهم.

إدارة التغييرات في الجدول الزمني ضرورية لأن التغييرات أمر حتمي في أي مشروع. يجب أن يمر كل طلب تغيير عبر عملية موحدة تشمل تقديم الطلب وتقييم تأثيره على الجدول الزمني والميزانية والنطاق، ثم الموافقة أو الرفض من لجنة التحكم في التغيير. يجب توثيق جميع التغييرات المعتمدة وتحديث الجدول الزمني فورا وإبلاغ جميع الأطراف المعنية. من أشهر المسببات للتأخير نطاق المشروع المتجدد حيث يتم إضافة متطلبات جديدة بشكل تدريجي دون تعديل الجدول الزمني والميزانية، مما يؤدي لتجاوز المواعيد وتجاوز الميزانية.

إدارة الفريق والقيادة

إدارة الفريق والقيادة هما من أهم المهارات التي يملكها مدير المشروع الناجح. المشروع مهما كانت خطته ممتازة وأدواته متقدمة لن ينجح بدون فريق محفز ومتناسق يعمل نحو هدف مشترك. فريق المشروع هو أكبر مورد وأهم أصل يمتلكه المدير، والقدرة على تجنيد الأشخاص المناسبين وتطويرهم وتحفيزهم وتوجيههم هي المفتاح الحقيقي للنجاح. فريق متحمس ومنسق يمكن أن يتغلب على عقبات كثيرة بينما فريق ممتلك المهارات لكن غير متحمس سيفشل حتما.

نموذج تطور الفريق المكون من خمس مراحل لنظرية Tuckman يعد من أهم الأطر الفكرية لفهم ديناميكيات الفريق. المرحلة الأولى هي التشكيل حيث يتعرف أعضاء الفريق على بعضهم البعض وعلى أهداف المشروع، وهناك عادة حذر وترقب. المرحلة الثانية هي العاصفة حيث تظهر الخلافات وتتصارع الأفكار والشخصيات، وهذه مرحلة طبيعية ضرورية. المرحلة الثالثة هي المعايير حيث يبدأ الفريق في وضع قواعد وأعراف مشتركة. المرحلة الرابعة هي الأداء حيث يعمل الفريق بكفاءة وانسجام عالي. المرحلة الخامسة هي التأجيل حيث ينتهي المشروع وينتشر الفريق.

بناء فريق فعال يبدأ باختيار الأشخاص المناسبين الذين يمتلكون المهارات المطلوبة والقدرة على العمل الجماعي. يجب أن يكون الفريق متنوعا في المهارات والخبرات ووجهات النظر لكن متوافقا في القيم والالتزام بالعمل. الأدوار في الفريق يجب أن تكون واضحة ومحددة بحيث يعرف كل عضو مسؤولياته وملاحياته. تطوير فريق المشروع أو Team Development يشمل التدريب وتبادل المعرفة والتوجيه وبناء الثقة وتعزيز التعاون. الاستثمار في تطوير الفريق يعود بالنفع على المشروع بأكمله.

التواصل الفعال هو حجر الأساس في إدارة الفريق. مدير المشروع يجب أن يتقن التواصل في جميع اتجاهات: مع الفريق ومع الإدارة العليا ومع العملاء ومع الموردين. يجب اختيار قناة التواصل المناسبة لكل نوع من المعلومات، حيث قد تناسب الاجتماعات المباشرة النقاشات المعقدة بينما تناسب الرسائل النصية التحديثات البسيطة. التواصل غير اللفظي يشكل أكثر من نصف الرسالة لذا يجب الانتباه إليه. الاستماع الفعال هو مهارة حاسمة تظهر الاحترام وتساعد في فهم الآخرين حقا.

تحفيز الفريق يتطلب فهم ما يحفز كل عضو على حدة. نظرية ماسلو للتسلسل الهرمي للاحتياجات ونظرية Herzberg بعاملين تلقيان ضوءا على ما يحفز الموظفين. التعرف المادي والتقدير والفرص للتطور والمشاركة في اتخاذ القرار والبيئة العملية الإيجابية كلها عوامل محفزة. مدير المشروع يجب أن يدرك أن الأعضاء المختلفين يحتاجون أنواعا مختلفة من التحفيز. المكافآت والاعتراف يجب أن تكون مرتبطة بالأداء الفعلي وعادلة وشفافة. الاحتفال بالإنجازات الصغيرة والكبيرة يعزز الروح المعنوية.

إدارة النزاعات أمر لا مفر منه في بيئة العمل الجماعية. النزاعات ليست بالضرورة سيئة بل يمكن أن تكون مصدر إبداع وتحسين إذا أُديرت بشكل صحيح. أنواع النزاعات تشمل نزاعات المهام المتعلقة بأساليب العمل، ونزاعات العمليات المتعلقة بالإجراءات، ونزاعات العلاقات الشخصية. يجب معالجة النزاعات مبكرا قبل أن تتصاعد. تقنيات حل النزاعات تشمل التفاوض والوساطة والبحث عن حلول رابحة للطرفين. تجنب النزاع أو فرض الحلول قد يحل المشكلة مؤقتا لكنه يترك استياء يتراكم.

القيادة في إدارة المشاريع تحتاج أسلوبا مرنا يتكيف مع الموقف والفريق. نظرية القيادة الموقفية تقترح أن الأسلوب القيادي يجب أن يعتمد على مستوى نضج الفريق. القائد قد يحتاج أن يكون موجها مع فريق جديد، ومشاركا مع فريق ناضج، ومفوضا مع فريق خبير. القائد التحويلي أو Transformational Leader يلهم الفريق ويرفع مستوى الطموح ويعزز الابتكار. أهم صفات القائد هي النزاهة والوضوح والتعاطف والقدرة على اتخاذ القرار والرؤية.

